新村橋上部工 工事だより

2026年 9月 Vol.3

9月は全国各地で雨の日が多くなり、上高地も例外ではありませんでした。気象データを調べてみると、9月は23日間も雨が降ったそうです。雨の中でも登山者の賑わいは変わることなく、今後は紅葉シーズンに入り更に増えるとのことで、引き続き安全第一で作業を進めてまいります。
現地の作業としては、アンカーブロック、鉄塔基礎のコンクリートが着々と仕上がっております。
10月下旬の鉄塔組立に向けてもうひと踏ん張りです！


現場作業の様子

右の写真はアンカーブロック部の写真です。斜めに設置されている鋼材はアンカーフレームという部材で、先端の孔にワイヤーを固定し、鉄塔を支える構造になっています。最大で約240tの荷重が作用するポイントとなりますので、施工の精度・コンクリートの品質が非常に重要となります。なお、コンクリートの運搬には1時間20分近くを要するため、コンクリート打設も長丁場となります。

下の写真は、先日搬入した鉄塔機材です。この鉄塔は自社で保有している機材であり、三重県津市から大型トラックで輸送しました。上高地の景観に配慮し、こげ茶色に塗装しているため、周囲の自然にも馴染む美しい仕上がりとなっています。鉄塔は高さ最大28mにもなるため、建った際には非常に目立つ構造物となり、本工事を象徴する構造物の一つとなることでしょう。





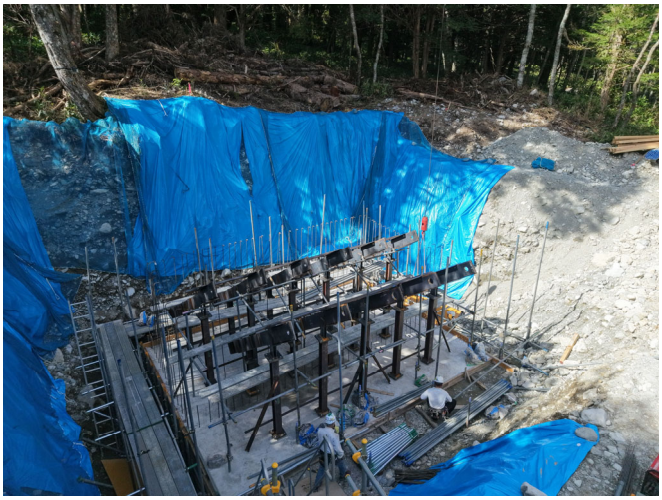

１０月の主な予定

【コンクリート打設予定】
10/1（木）
10/6（火）
10/7（水）
10/9（金）
10/20（火）

【その他】
鉄塔組立　10/21（水）～
※天候や作業の進捗により変更する可能性があります。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

令和6年度上高地新村橋上部工工事
JFE・ヤマウラ特定工事建設共同企業体

〒390-1401
長野県松本市波田3094-2
電話：0263-31-5238

現場代理人　栗田
